Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région de Tanger-Tetouan- Alhoceima
Préfecture de Tanger- Asilah
Commune de Gueznaia

Avis d'achat sur bons de commande n°32/2026

Le Président de la Commune Gueznaia procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation *: travaux d'installation des abris préfabriqué dans les grandes places de la C.G.*

N°	*Désignation de prestations*	*Description de prestations*	*Uté*	*Qté*	*PU H.T*	*PU H.T*	*GARANTIES EXIGES*
1	***travaux d'installation* des abris de taxi préfabriqué de dimensions : long= 4 m larg. = 2 m haut= 2 ,40 m comprenant poteaux, toiture, bancs, traverses, cadres, supports et accessoires de fixation.**	• Fourniture et pose de la toiture Sandwiche, y compris ossature secondaire, profils, fixations et étanchéité. • Abri modulable 5 pieds en acier galvanisé . • Structure en tube rectangulaire 80mm/40mm en acier. Ep. 3mm. • Fourniture et pose des panneaux arrière et latéraux transparents en polycarbonate, avec cadres métalliques et accessoires de fixation. • Fourniture et pose des bancs intérieurs, acier galvanisé, avec assises résistantes aux conditions extérieures et supports de fixation. • Protection contre toutes les conditions météorologiques (soleil, hiver ; Vent…) • Fixation par platines sous la plate forme avec une profondeur de30 cm. Y compris logo de la commune, Transport, montage, fixation au sol et installation complète, y compris toutes sujétions nécessaires à la mise en service.	U	03			NB : Voire La fiche technique. 
		Total HT					
		TVA 20%					
		Total TTC					

Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : ……

Avis important :

Lieu d'exécution : Commune Gueznaia,

Délai d'exécution de la prestation : 30 jours,

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 20 NOV 2026 ***à 12h***

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Le président de la commune de Gueznaia et par Délégation
Mohammed SIMILLA
Chef des services de la Commune


Ministère de l'Intérieur – Préfecture Tanger - Asilah Commune Gueznaia – S. des Travaux, Marchés et affaires économiques



Vue de face



Vue de côté

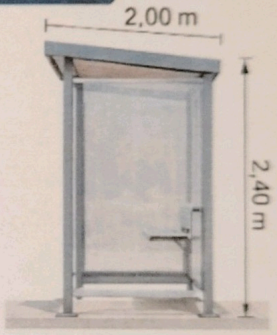

Royaume de Marne Ministère de l'Intérieur
S. des Travaux, Marchés et affaires économiques

Caractéristiques techniques


- ✓ **Dimensions :**
  Longueur : 4,00 m
  Largeur : 2,00 m
  Hauteur : 2,40 m
- ✓ **Structure :**
  Poteaux et traverses en acier galvanisé, tube rectangulaire 80 mm / 40 mm, ép. 3 mm
- ✓ **Toiture :**
  Panneaux sandwich avec ossature secondaire, profils, fixations et étanchéité
- ✓ **Parois :**
  Panneaux arrière et latéraux transparents en polycarbonate, avec cadres métalliques
- ✓ **Banquette :**
  Assise en acier galvanisé, résistante aux intempéries
- ✓ **Fixation :**
  Platine de fixation sur dalle béton, profondeur d'ancrage ≥ 30 cm

Détail de la structure



Tube rectangulaire 80 mm x 40 mm ép. 3 mm

Détail de la toiture



Toiture sandwich avec étanchéité

Détail des parois



Polycarbonate transparent

Détail du banc



Banquette en acier galvanisé

Détail de fixation



Platine de fixation (profondeur ≥ 30 cm)

Protection assurée

Soleil · Pluie · Vent · Hiver

Un abri robuste, durable et sécurisé pour les usagers
